

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2019

Localidad de
Rafael Uribe
Uribe

Secretaría Distrital de Planeación

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

CONTENIDO

1.	MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL	1
2.	INTRODUCCIÓN	2
3.	BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL	3
3.1	EJECUCIÓN POR METAS	9
4.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	13
5.	PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL	17
5.1	TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	21
6.	DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS	30
7.	ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019	37

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

En el mes de enero de 2020 asumo las funciones en condición de encargo, siendo mi permanencia transitoria y durante el plazo de nueva elección de Alcalde Local en propiedad; así las cosas, la actual administración que lidero, viene realizando una revisión al cumplimiento de las metas y ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo Local para la vigencia 2019, con el fin de hacer la retrospección necesaria para el presente ejercicio de Rendición de Cuentas.

En ese orden, se evidencia que la formulación de los proyectos de la vigencia 2019 se realizó con base en las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local adelantando los procesos de contratación y el cumplimiento de las mismas; para lo cual fue necesario contar, de una parte con el apoyo y trabajo de la comunidad, cuyas instancias se hicieron partícipes manifestando las necesidades latentes en la localidad y de otra parte las entidades del orden Distrital que proporcionaron el respectivo acompañamiento técnico, con el fin de verificar que la ejecución se ajuste en su cumplimiento al sentir de los habitantes en el marco de las líneas de inversión vigentes.

Para el año 2019, la ejecución presupuestal de inversión directa de la localidad alcanzó el 94.5% de los recursos destinados para los tres pilares estructurales de carácter prioritario, que junto a los ejes transversales han permitido alcanzar los objetivos centrales del Plan de Desarrollo Local, entre los cuales se encuentran: 1. Desarrollar y fortalecer procesos enfocados a estimular a la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, adulto mayor y primera infancia; 2. Recuperar la infraestructura vial y de espacio público, mediante la ejecución de programas orientados a la construcción y mantenimiento de parques y malla vial local; 3. Desarrollar estrategias de promoción de la convivencia y la cultura ciudadana, donde los habitantes de Rafael Uribe Uribe puedan encontrar la acción del Gobierno Local y Distrital; 4. Implementar acciones y estrategias que buscarán la protección, ampliación, fomento del disfrute, del buen uso y apropiación de las zonas verdes, y demás elementos de valor ambiental de la localidad y; 5. Fortalecer la gobernabilidad democrática local, ampliando las capacidades de producción eficiente y eficaz de servicios y acciones de gestión de desarrollo, inspección, vigilancia y control en la Localidad.

Durante la vigencia 2019 se avanzó en el cumplimiento de las metas, impactando positivamente la población y el territorio local en toda su extensión, cumpliendo con el 79,6% del avance acumulado contratado y el 44% del avance acumulado entregado del Plan de Desarrollo, mediante una sinergia en la destinación de recursos y las mejoras de calidad de vida dando cumplimiento al plan de desarrollo local RAFAEL URIBE “MEJOR PARA TODOS” 2017 – 2020.

WILIAM ALEJANDRO RIVERARA CAMERO

Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. INTRODUCCIÓN

Al revisar las cifras de la vigencia 2019, en la búsqueda del cometido del beneficio directo a la comunidad, el Plan de Desarrollo Local evidencia los siguientes logros en porcentajes de productos y servicios entregados a la comunidad, de acuerdo con las metas programadas para el cuatrienio, así:

METAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE (%) ALCANZADO
Personas con subsidio tipo C	75%
Eventos artísticos y culturales realizados	100%
Dotaciones para seguridad	75%
Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	213%
Arboles sembrados o intervenidos:	145%
m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	108%
Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control social	509%

Fuente: Elaboración propia – Oficina Planeación FDLRUU

Es preciso mencionar los avances de cada uno de los pilares que conforman el Plan de Desarrollo Local, de manera que se tenga una perspectiva más detallada del cumplimiento de las metas:

El mayor avance de presupuesto contratado se encuentra en el pilar de DEMOCRACIA URBANA con el 87,8% circunstancia que define muy bien el tipo de necesidades que requiere nuestra población y el cual abarca una cifra considerable de presupuesto, toda vez que incluye los proyectos dirigidos al mejoramiento de la infraestructura local.

Sin embargo, este mismo programa es el menos representativo en cuanto refiere al porcentaje de entrega a la comunidad con apenas el 25,4%, situación que obedece a la complejidad de la ejecución que se suma al rezago que arrastra la Localidad en materia de su ejecución, pues se vienen desarrollando procesos de vigencias anteriores, circunstancia que entra a explicar el bajo valor, puesto además la cifra que se reporta, solamente considera contratos ya ejecutados sin saldo y recibidos a satisfacción.

Aun así, las cifras del avance por Pilar o Eje muestran un avance de ejecución con una distribución normal acorde a lo programado en el Plan de Desarrollo Local, pues la diferencia entre el valor contratado frente al valor entregado es baja, con excepción del Pilar DEMOCRACIA URBANA como ya se citó en forma tal que la ejecución de metas reporta un avance acumulado contratado del Plan de Desarrollo Local del 79,6%, frente al 44% de productos y servicios entregados que corresponden a un comportamiento a mejorar en la ejecución del Plan de Desarrollo, cuya situación como se explicó se origina en la baja ejecución física de las apropiaciones en la vigencia de su apropiación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL

AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Rafael Uribe Uribe a 31 de diciembre de 2019 presentó un avance acumulado contratado del PDL del 79.6%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados a esa fecha, el plan presentó un avance del 44%, lo que indica que el 55,3% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

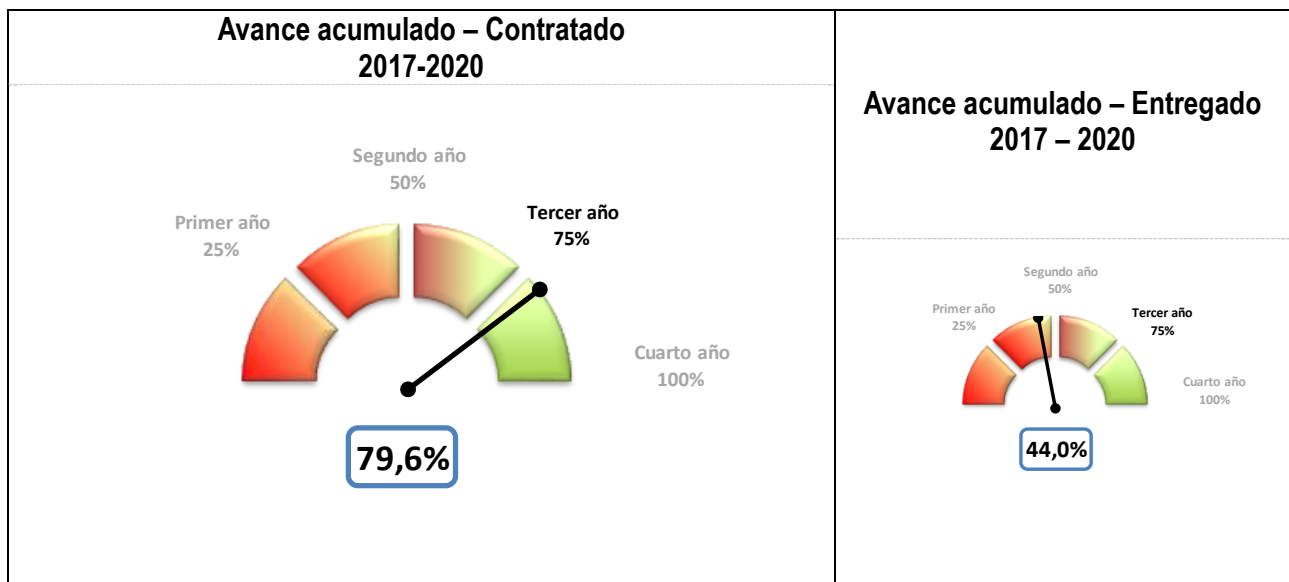


Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2018 con un 25,8% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 20,7%.


Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

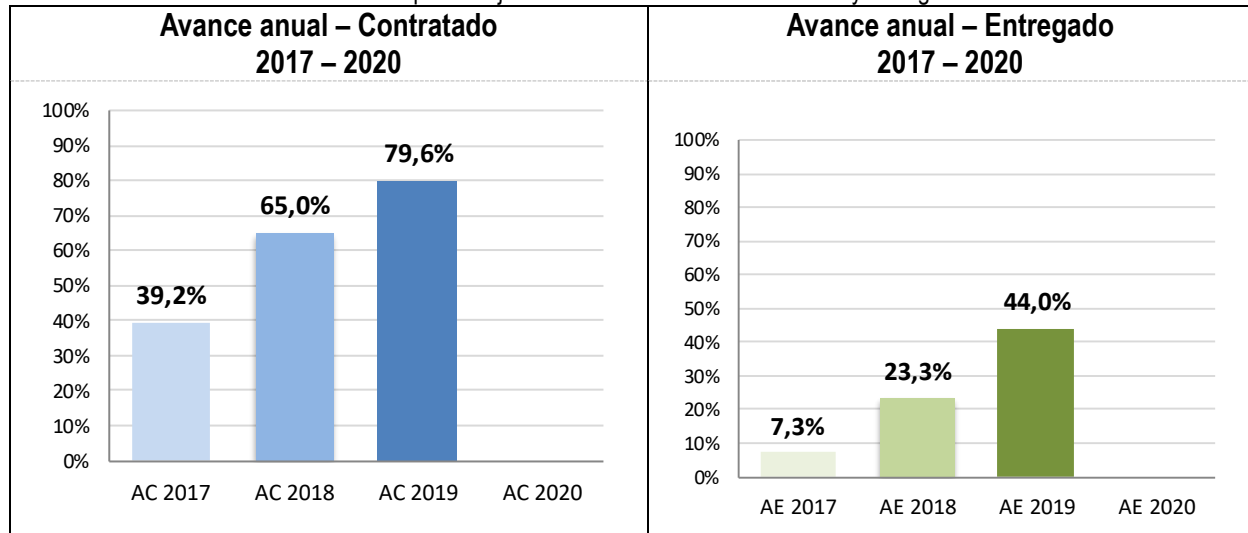

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Rafael Uribe Uribe ocupa el décimo tercer lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto vigésimo.

Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad.

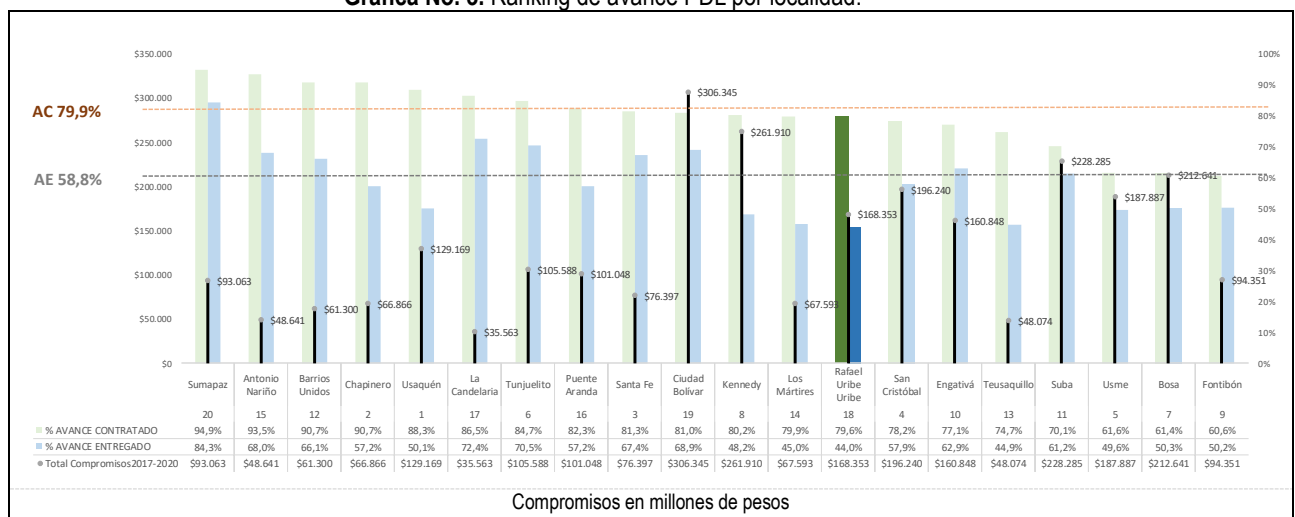

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el Pilar Democracia urbana (87.8%), que incluye los temas relacionados con construcción y mantenimiento de la malla vial y espacio público, demandas de titulación e intervención de parques. En segundo lugar, está el eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (81.6%) que incluye los temas relacionados con participación, inspección, vigilancia y control – IVC y el fortalecimiento institucional. Y, en tercer lugar, el eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética (80.9%) que incluye los temas relacionados con arborización, coberturas verdes, jardinería, protección y bienestar animal y agricultura urbana. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (81.3%).

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje.

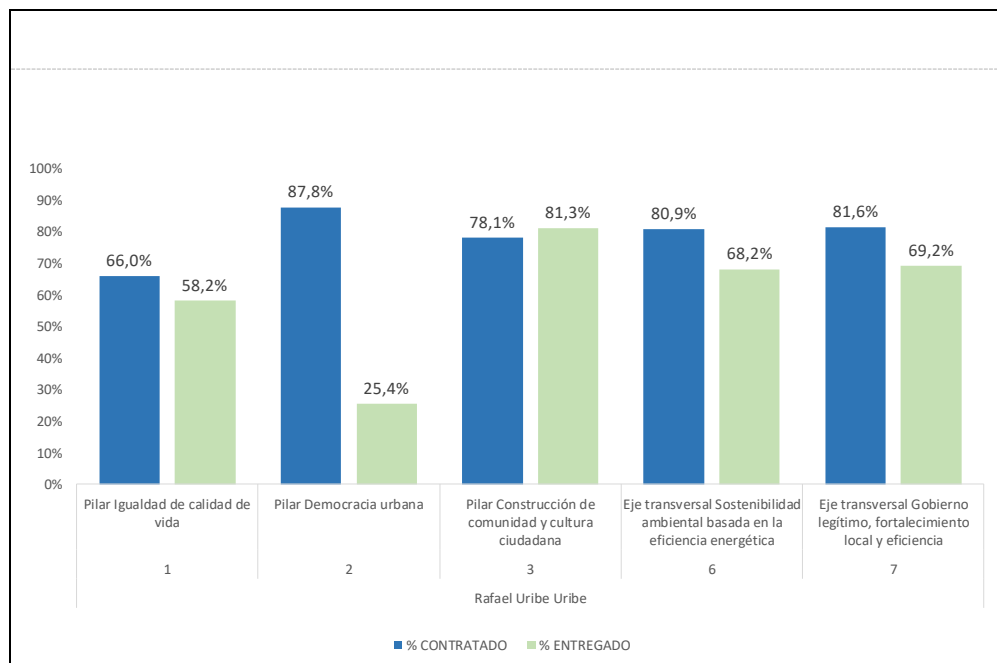

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con 11 programas. De los cuales sobresalen en el avance contratado, Espacio público derecho de todos, con 100%, Mejor movilidad para todos (85.6%) y Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte (84.3%). El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Mejor movilidad para todos con \$24.544 millones.

Gráfica No. 5. Avance programas.

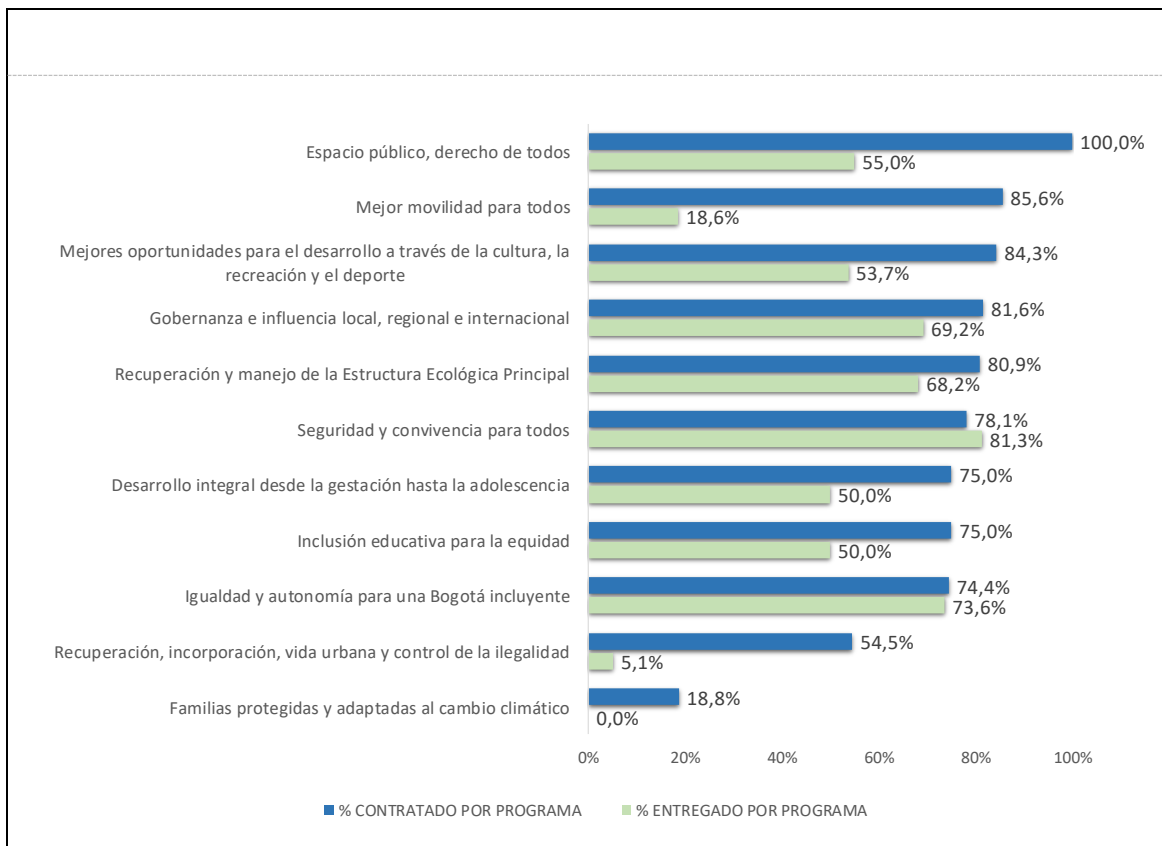

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Rafael Uribe Uribe, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 15 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia.

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión.

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017 2020
3-3-1-15-01-02-1535-00	Desarrollo integral para la primera infancia	75,0%	\$390	\$325	\$300	\$1.015
3-3-1-15-01-03-1536-00	Apoyo e Igualdad para el adulto mayor	75,0%	\$10.011	\$10.531	\$9.783	\$30.324
3-3-1-15-01-03-1537-00	Ayudas Técnicas a personas con discapacidad	64,9%	\$626	\$713	\$378	\$1.717
3-3-1-15-01-04-1538-00	Obras de mitigación en zonas de riesgo de la Localidad de Rafael Uribe Uribe	18,8%	\$50	\$5.052	\$997	\$6.099
3-3-1-15-01-07-1539-00	Inclusión educativa para la localidad de Rafael Uribe Uribe	75,0%	\$344	\$403	\$300	\$1.047
3-3-1-15-01-11-1540-00	Deporte arte y cultura mejor para todos	84,3%	\$512	\$2.426	\$1.991	\$4.930
3-3-1-15-02-15-1541-00	Garantía y acceso justicia	54,5%	-	\$586	\$293	\$879
3-3-1-15-02-17-1543-00	Garantía y disfrute del espacio público	100,0%	\$4.588	\$9.165	\$5.828	\$19.581
3-3-1-15-02-18-1544-00	Malla Vial Local y espacio público	85,6%	\$20.095	\$25.073	\$24.544	\$69.711
3-3-1-15-03-19-1545-00	Convivencia ciudadana y seguridad para todos	78,1%	\$2.331	\$2.610	\$1.746	\$6.688
3-3-1-15-06-38-1546-00	Recuperación de los recursos ambientales de la Localidad	100,0%	\$344	\$385		\$729
3-3-1-15-06-38-1547-00	Acciones de agricultura urbana	75,0%	\$161	\$194	\$189	\$544
3-3-1-15-06-38-1548-00	Cuidado y manejo de mascotas	50,0%	-	\$206	\$205	\$412
3-3-1-15-07-45-1549-00	Apoyo a la gestión pública local	79,7%	\$4.294	\$6.782	\$8.912	\$19.989
3-3-1-15-07-45-1550-00	Acciones de fortalecimiento para la participación ciudadana y control social	87,5%	\$998	\$1.938	\$1.752	\$4.688

Cifras en millones pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NIVEL DE AVANCE POR METAS

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Para la localidad de Rafael Uribe Uribe, existe un total de 26 metas en el PDL. Del total de metas, 1 presenta un nivel de avance contratado bajo, 5 un nivel medio y 20 un nivel alto. En este sentido, el 80.8% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3.1 EJECUCIÓN POR METAS

EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en 2019 se programaron 25 metas, de las cuales, 21 (84%) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019.

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, incluyendo los HOBIS del ICBF	6,0	6,0	100,0%
Beneficiar 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C	6.500,0	6.500,0	100,0%
Beneficiar 1000 personas de la localidad con ayudas técnicas - que no se encuentren incluidas en el POS	250,0	149,0	59,6%
Realizar 4 obras de mitigación de riesgo anualmente	1,0	-	-
Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico	7,0	7,0	100,0%
Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad	2,0	2,0	100,0%
Realizar 8 eventos de recreación y deporte en la localidad	2,0	-	-
Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y cultural , incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU	500,0	630,0	126,0%
Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU	500,0	2.330,0	466,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Pilar 2. Democracia urbana.

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la correspondiente demanda de titulación del predio	200,0	150,0	75,0%
Intervenir 60 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad	15,0	9,0	60,0%
Construir 8 Km/carril de malla vial local	2,0	1,7	-
Mantener 24 Km/carril de malla vial local, incluyendo bacheo y reparacheo	6,0	10,0	166,7%
Construir 15000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas	3.750,0	1.680,0	44,8%
Mantener 20000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas	5.000,0	10.000,0	200,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Pilar 3. Construcción de comunidad.

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para seguridad en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y dotación a la policía de la localidad	1,0	1,0	100,0%
Vincular 4000 personas de la Localidad a ejercicios de convivencia ciudadana	1.000,0	500,0	50,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Intervenir 1000 árboles de la localidad	250,0	-	-
Intervenir 5000 m2 de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	1.250,0	-	-
Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad	1,0	1,0	100,0%
Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de esterilización	1,0	1,0	100,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional	1,0	1,0	100,0%
Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, incluidas razas de perro peligrosas	1,0	1,0	100,0%
Fortalecer 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con asiento en la localidad, e intervención y dotación a salones comunales	11,0	1,0	9,1%
Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, incluyendo copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad	375,0	5.840,0	1557,3%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020

La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado acumulado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 7. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador.

Cód	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anualización	Magnitud Programada 2017-2020	Magnitud Contratada 2017-2020	Magnitud Entregada 2017-2020	% Avance Acumulado contratado 2017-2020	% Avance Acumulado Entregado 2017-2020
1	Malla vial, espacio público y peatonal	Km/carril de malla vial local construido	Suma	8	9	2	107,9%	25,0%
		Km/carril de malla vial local mantenido	Suma	24	37	3	154,8%	14,2%
		m2 de espacio público construidos	Suma	15.000	5.430	2.400	36,2%	16,0%
		m2 de espacio público mantenidos	Suma	20.000	19.300	3.300	96,5%	16,5%
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	Suma	60	78	33	130,0%	55,0%
3	Seguridad y convivencia	Dotaciones para seguridad realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
		Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	4.000	3.500	8.500	87,5%	212,5%
4	Inspección, vigilancia y control - IVC	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
		Demandas de titulación predial presentadas	Suma	550	300	28	54,5%	5,1%
5	Atención a población	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	Constante	6.500	4.875	4.875	75,0%	75,0%
6	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Constante	1	1	1	75,0%	75,0%
7	Atención a población	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	Suma	1.000	649	500	64,9%	50,0%
8	Dotación	IED dotados con material pedagógico	Suma	28	21	14	75,0%	50,0%
		Jardines infantiles dotados	Suma	24	18	12	75,0%	50,0%
9	Obras prioritarias de mitigación o	Obras de mitigación de riesgo realizadas	Constante	4	1	-	18,8%	-
10	Procesos de formación artística, cultural y deportiva	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	Suma	2.000	1.630	1.000	81,5%	50,0%
		Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	Suma	2.000	3.228	898	161,4%	44,9%
11	Eventos artísticos, culturales y deportivos	Eventos artísticos y culturales realizados	Suma	8	8	8	100,0%	100,0%
		Eventos de recreación y deporte realizados	Suma	8	3	3	37,5%	37,5%
12	Protección y recuperación de los recursos ambientales	Arboles sembrados o intervenidos	Suma	1.000	1.450	1.450	145,0%	145,0%
		m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	5.000	5.387	5.387	107,7%	107,7%
13	Participación	Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control	Suma	44	38	13	86,4%	29,5%
		Acciones de agricultura urbana implementadas	Suma	1.500	7.640	7.640	509,3%	509,3%
15	Proyecto estratégico	Acciones de protección animal realizadas	Suma	4	3	2	75,0%	50,0%
			Suma	4	2	1	50,0%	25,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe ha comprometido un presupuesto acumulado de \$168.353 millones en las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la vigencia 2019 con un valor de \$57.219 millones (94.6%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2017, los cuales fueron por valor de \$18.629 millones (36.5%).

Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar.

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL

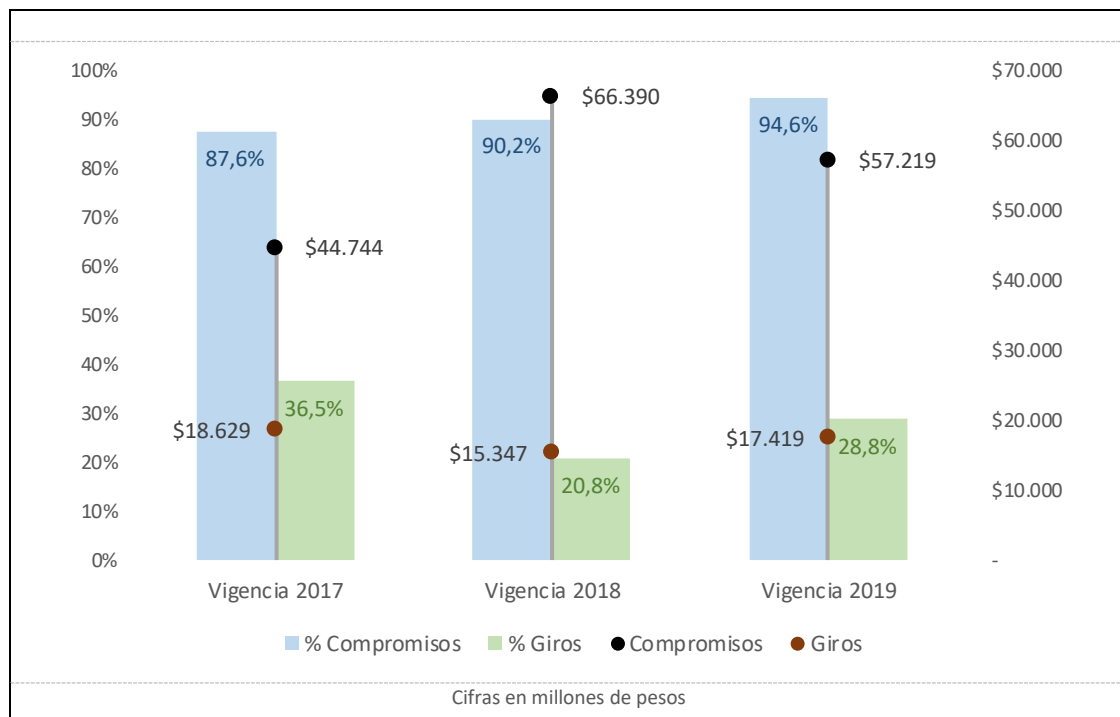

Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad \$69.711 millones, que representa el 41.4% del total del presupuesto de inversión, Integración social con \$31.339 millones (18.6%) y Gobierno \$24.677 millones (14.7%).

Tabla No. 8. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019.

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$20.095	\$25.073	\$24.544	\$69.711	41,4%
Sector Integración social	\$10.401	\$10.856	\$10.082	\$31.339	18,6%
Sector Gobierno	\$5.292	\$8.721	\$10.664	\$24.677	14,7%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$5.100	\$11.591	\$7.819	\$24.511	14,6%
Sector Ambiente	\$555	\$5.837	\$1.392	\$7.784	4,6%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2.331	\$2.610	\$1.746	\$6.688	4,0%
Sector Salud	\$626	\$713	\$378	\$1.717	1,0%
Sector Educación	\$344	\$403	\$300	\$1.047	0,6%
Sector Hábitat	-	\$586	\$293	\$879	0,5%
TOTALES	\$44.744	\$66.390	\$57.219	\$168.353	100,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: PREDIS vigencia 2019

EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 9. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019
Anexo 1 (85%)	85,0%	92,3%	84,6%	82,5%	85,0%	89,3%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	20,6%	22,4%	17,2%	15,9%	17,5%	17,1%
Gestión pública local	5,4%	7,2%	7,5%	7,2%	8,3%	11,1%
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	2,4%	7,9%	3,9%	5,5%	5,0%
Malla vial, espacio público y peatonal	40,0%	44,9%	37,9%	37,8%	41,1%	42,9%
Parques	10,0%	10,3%	9,5%	13,8%	9,7%	10,2%
Seguridad y convivencia	5,0%	5,2%	4,7%	3,9%	3,0%	3,1%
Anexo 2 (15%)	15,0%	7,7%	15,4%	17,5%	15,0%	10,7%
Atención a población vulnerable	1,2%	1,4%	1,2%	1,1%	0,9%	0,7%
Dotación	1,5%	1,6%	1,4%	1,1%	1,0%	1,0%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	0,9%	0,4%	0,8%	0,6%	0,8%	0,5%
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo	5,3%	0,1%	5,0%	7,6%	4,2%	1,7%
Participación	2,6%	2,2%	2,5%	2,9%	4,5%	3,1%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	2,1%	0,8%	3,2%	3,0%	2,6%	3,0%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	0,7%	0,8%	0,7%	0,6%	0,3%	-
Proyecto estratégico	0,7%	0,4%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC.

En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, los mayores recursos comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de \$69.711 millones, “Atención a población vulnerable” con \$30.324 millones y “Parques” con \$19.581 millones.

Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos durante el periodo del PDL son: “Obras prioritarias de mitigación” con un monto de \$6.099 millones “Participación” con \$4.688 millones, y “Procesos de formación artística, cultural y deportiva” con \$4.073 millones.

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 10. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017_2020
Anexo 1 (85%)	\$43.299	\$41.320	\$52.370	\$54.748	\$51.151	\$51.106	\$147.173
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$10.485	\$10.011	\$10.640	\$10.531	\$10.537	\$9.783	\$30.324
Gestión pública local	\$2.768	\$3.202	\$4.616	\$4.753	\$4.979	\$6.356	\$14.311
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.037	\$1.093	\$4.873	\$2.616	\$3.298	\$2.849	\$6.557
Malla vial, espacio público y peatonal	\$20.371	\$20.095	\$23.449	\$25.073	\$24.708	\$24.544	\$69.711
Parques	\$5.092	\$4.588	\$5.862	\$9.165	\$5.829	\$5.828	\$19.581
Seguridad y convivencia	\$2.546	\$2.331	\$2.931	\$2.610	\$1.800	\$1.746	\$6.688
Anexo 2 (15%)	\$7.624	\$3.425	\$9.552	\$11.643	\$9.023	\$6.113	\$21.180
Atención a población vulnerable	\$634	\$626	\$730	\$713	\$530	\$378	\$1.717
Dotación	\$740	\$734	\$852	\$728	\$600	\$600	\$2.062
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$433	\$172	\$499	\$411	\$469	\$274	\$856
Obras prioritarias de mitigación o prevención de Participación	\$2.708	\$50	\$3.117	\$5.052	\$2.537	\$997	\$6.099
Procesos de formación artística, cultural y depor	\$1.349	\$998	\$1.553	\$1.938	\$2.689	\$1.752	\$4.688
Protección y recuperación de los recursos ambie	\$1.051	\$341	\$1.985	\$2.015	\$1.585	\$1.718	\$4.073
Proyecto estratégico	\$350	\$344	\$403	\$385	\$200		\$729
	\$359	\$161	\$413	\$400	\$413	\$395	\$956

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL

Los logros alcanzados en el avance de metas del Plan de Desarrollo local que se presentan a continuación son muestra del papel importante que jugó el equipo de la Alcaldía Local, para lograr un buen nivel de gestión durante la vigencia de 2019, en cada una de las diferentes etapas que materializaron el compromiso y ejecución de los recursos.

Presupuestalmente se trabajó para mejorar el indicador referente a las obligaciones por pagar, disponiendo para efectos de una gestión adecuada de la contratación de personal de apoyo específicamente en esta labor. Sin embargo, la Localidad aún registra un valor importante de saldo que viene desde anteriores vigencias, siendo necesario continuar con la labor de la depuración, pues se registran saldos por valor superior a 68 mil millones de pesos representados en procesos en trámite de liquidación desde la vigencia 2013 en adelante.

Pilar Igualdad de calidad de vida.

En el marco del programa Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia referente a Dotación de Jardines infantiles y UNIDADES DE SERVICIO (antes HOGARES DE BIENESTAR – HOBI'S del ICBF) se dotaron seis (6) jardines de la Secretaría de Integración Social de la localidad con material pedagógico, así como a las (375) UNIDADES DE SERVICIO a cargo del ICBF presentes en el territorio. Así mismo, el programa Inclusión educativa para la equidad realizado en convenio con la Secretaría de Educación, realizó la dotación de (7) IED de la localidad con material pedagógico y tecnológico. En ambos casos se obtuvieron economías de escala importantes en la adquisición de los elementos de dotación para jardines y recursos tecnológicos a colegios; en el primer caso por la aplicación del procedimiento de subasta inversa y en caso de la dotación a colegios, al optar nuestra localidad por integrar el convenio marco con otras (16) localidades, conformando así una sola bolsa de recursos aplicados en una única operación de compra.

En el programa Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente se realizó la entrega del bono Subsidio tipo C, para (6.500) adultos mayores de la localidad.

Por otro lado, el proyecto Ayudas Técnicas a personas con discapacidad, benefició a 250 personas con ayudas técnicas no incluidas en el POS, mejorando su calidad de vida.

En los procesos de Cultura y Deporte se crearon Escuelas de Formación Deportiva para (710) niños, niñas y adolescentes, (142) por cada UPZ, y (188) personas en condición de discapacidad de toda la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



localidad, donde se formaron en fútbol, microfútbol, baloncesto, patinaje, taekwondo, y porras, actividades de deporte adaptado: Fútbol 5, baloncesto, boccia, natación, ajedrez, atletismo. Adicionalmente se beneficiaron (1.000) adultos con actividad Física y recreativa (200 por cada UPZ).

Se realizó una viejoteca donde participaron mil (1000) adultos mayores. Durante el mes de diciembre se efectuó una tarde navideña en el parque del barrio MARRUECOS con la presentación de (10) artistas locales para una asistencia de tres mil (3000) personas y (160) de ellas beneficiadas con recordatorios.

Por otra parte, se instauró la escuela de formación artística, donde se beneficiaron (450) personas, de las cuales, (250) fueron niños, niñas y jóvenes; (150) adultos; y (50) personas en condición de discapacidad. Se fortaleció el Centro orquestal Rafael Uribe Uribe con instrumentos musicales para beneficio de (150) niños que se reúnen en el colegio Distrital Quiroga alianza.

Durante el desarrollo del programa Recuperación de los recursos ambientales de la localidad se ejecutaron acciones de plantación, mantenimiento de árboles y jardinería que recuperaron y embellecieron espacios del territorio. Al mismo tiempo, se ejecutaron actividades con el fin de conservar y preservar espacios verdes, limpieza, poda, recolección de escombros, plantación de jardineras, encerramientos, contando con el apoyo de la comunidad y vigías ambientales.

Pilar Democracia urbana.

Durante la vigencia, el proyecto de Espacio Público entregó (31) parques en las cinco UPZ de la localidad (contratados en la vigencia 2016): Quiroga, San José, Marruecos, Diana Turbay y Macro Fidel Suarez. Además, se llevó a cabo la recuperación y mantenimiento de (146) segmentos de malla vial e infraestructura generando con ello mejores condiciones para la movilidad y mejor calidad de vida.

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana.

Se realizaron actividades que fomentan la protección de la vida de los niños, niñas y adolescentes, en los entornos escolares y parques, así como en los puntos críticos de seguridad en especial los lugares de ocurrencia de homicidios y feminicidios, en la localidad.

Se comprometieron recursos para desarrollar procesos que fortalezcan las acciones de promoción de comportamientos para la convivencia y la prevención de violencias y delitos, adelantadas por la estación de Policía en coordinación con la Alcaldía local Rafael Uribe Uribe por el orden de \$1750 millones de pesos representados en equipos automotores para el refuerzo de la vigilancia por parte de la policía; promotores de convivencia y acciones de sensibilización a cargo de un operador externo en prevención de violencias.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Se desarrolló la Escuela de Seguridad y Convivencia, se realizaron cuarenta y dos (42) comités de seguridad, con los que se logró la recuperación de cuarenta y dos (42) puntos críticos de inseguridad.

Se realizó la formación a veintiocho (28) colegios para fortalecer entornos escolares, quince (15) campañas de marcación de vehículos, quince (15) campañas de tenencia de animales de razas peligrosas, cien (100) talleres con mujeres víctimas de violencia, y ochenta (80) talleres con barristas de la localidad.

Se realizó sensibilización a treinta (30) actores voluntarios de convivencia.

Se adquirieron siete vehículos tipo panel (7) de vigilancia y cuatro (4) motocicletas que entran a reforzar el parque automotor de la Policía de la localidad.

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Se ejecutaron acciones de plantación, mantenimiento de árboles y jardinería, entre los que vale la pena destacar el mantenimiento de árboles jóvenes en cuatro UPZ de la localidad: En UPZ QUIROGA (162) árboles; UPZ MARCO FIDEL SUAREZ (17); UPZ MARRUECOS (510); y UPZ DIANA TURBAY (111).

En cuanto al mantenimiento de jardineras se cuentan: En UPZ QUIROGA (1592,4) metros cuadrados de superficie intervenida; en la UPZ MARRUECOS (170) metros cuadrados; en la UPZ DIANA TURBAY (357) metros cuadrado. Así mismo se llevaron a cabo actividades de espacios más saludables con acciones de limpieza, poda, recolección de escombros, plantación de jardineras, encerramientos, con apoyo de la comunidad y vigías ambientales, se recuperaron y embellecieron espacios en la localidad.

Al mismo tiempo se efectuó la intervención en zonas de ronda de fuentes hídricas: Canal de Río Seco y quebrada la Guairita, UPZ Marco Fidel Suarez: Granjas de San Pablo, Luis López Mesa, Colinas y Río de Janeiro, UPZ Diana Turbay: Nueva esperanza, La Esperanza, Diana Turbay sector Cultivos, Diana Turbay sector El Valle, Los Puentes, Serranías, La Marqueza, San Ignacio, Diana Turbay sector La Torre, Palermo Sur sector Las Brisas y el Portal II, UPZ Marruecos: El Consuelo, Villas de recuerdo, Mirador de marruecos y Playón y Playita.

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Se asignaron los recursos para lograr el fortalecimiento de 26 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación social, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, y otras instancias con asiento en la localidad, propendiendo por la ampliación de la capacidad de provisión eficiente y eficaz de servicios y acciones de gestión del desarrollo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Se comprometieron los recursos para vincular (1500) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, lo cual va a repercutir en el fortalecimiento en la gobernanza.

Finalmente, se destinaron recursos importantes para dotar y mantener las instalaciones de las Juntas de Acción Comunal de la localidad garantizando las condiciones para la debida participación y el control social por parte de los delegados comunales de la localidad.

De su parte y en lo que respecta a la entrega efectiva de obras, bienes y servicios el indicador reportado, por el orden del 44%, le impone a la Administración Local la meta de alcanzar el cumplimiento de la disposición legal de la ejecución de los recursos en la misma vigencia de su apropiación.

Logros alcanzados a través de la gestión de la Administración Local.

Si bien es cierto, no forman parte del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local, son acciones transversales requeridas para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad y por lo tanto es importante hacer mención de ellos a continuación:

Se contrataron ocho (8) procesos en curso de 2018 correspondientes a temas de infraestructura; se realizó el proceso de contratación y se lograron celebrar, cumpliendo con las metas y propendiendo por el avance de las mismas que se encontraban con porcentajes de retraso que oscilaban entre el 30 y 40%.

Depuración Obligaciones por pagar: Se creó el equipo de obligaciones por pagar, con el fin de depurar las obligaciones que los en los periodos de los anteriores alcaldes (e) alcaldes anteriores habían quedado pendientes de concluir, principalmente contratos de obra pública y prestación de servicios. La ejecución de las Obligaciones por pagar a corte 31 de diciembre correspondió al 91,7% lo que significó una depuración considerable.

Consolidación participación ciudadana: Durante el período de gestión se logró consolidar la participación de las diferentes instancias en eventos locales y distritales, acercando más la entidad a los habitantes de la localidad.

Depuración Expedientes Gestión policiva: Durante el período a reportar se depuró en más del 50% los expedientes anteriores a la entrada en vigencia del Código de Policía, generando beneficios para la entidad y para la comunidad.

Ejecución de contratos 2018 y vigencias anteriores: Se ejecutaron los contratos celebrados en la vigencia 2018 y en vigencias anteriores que estaban pendientes por iniciar. Cabe aclarar que se solicitaron los conceptos a los que hubo lugar para iniciar aquellos que presentaban dificultades incluso desde el proceso precontractual.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN


La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Mapa 1. Territorialización Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

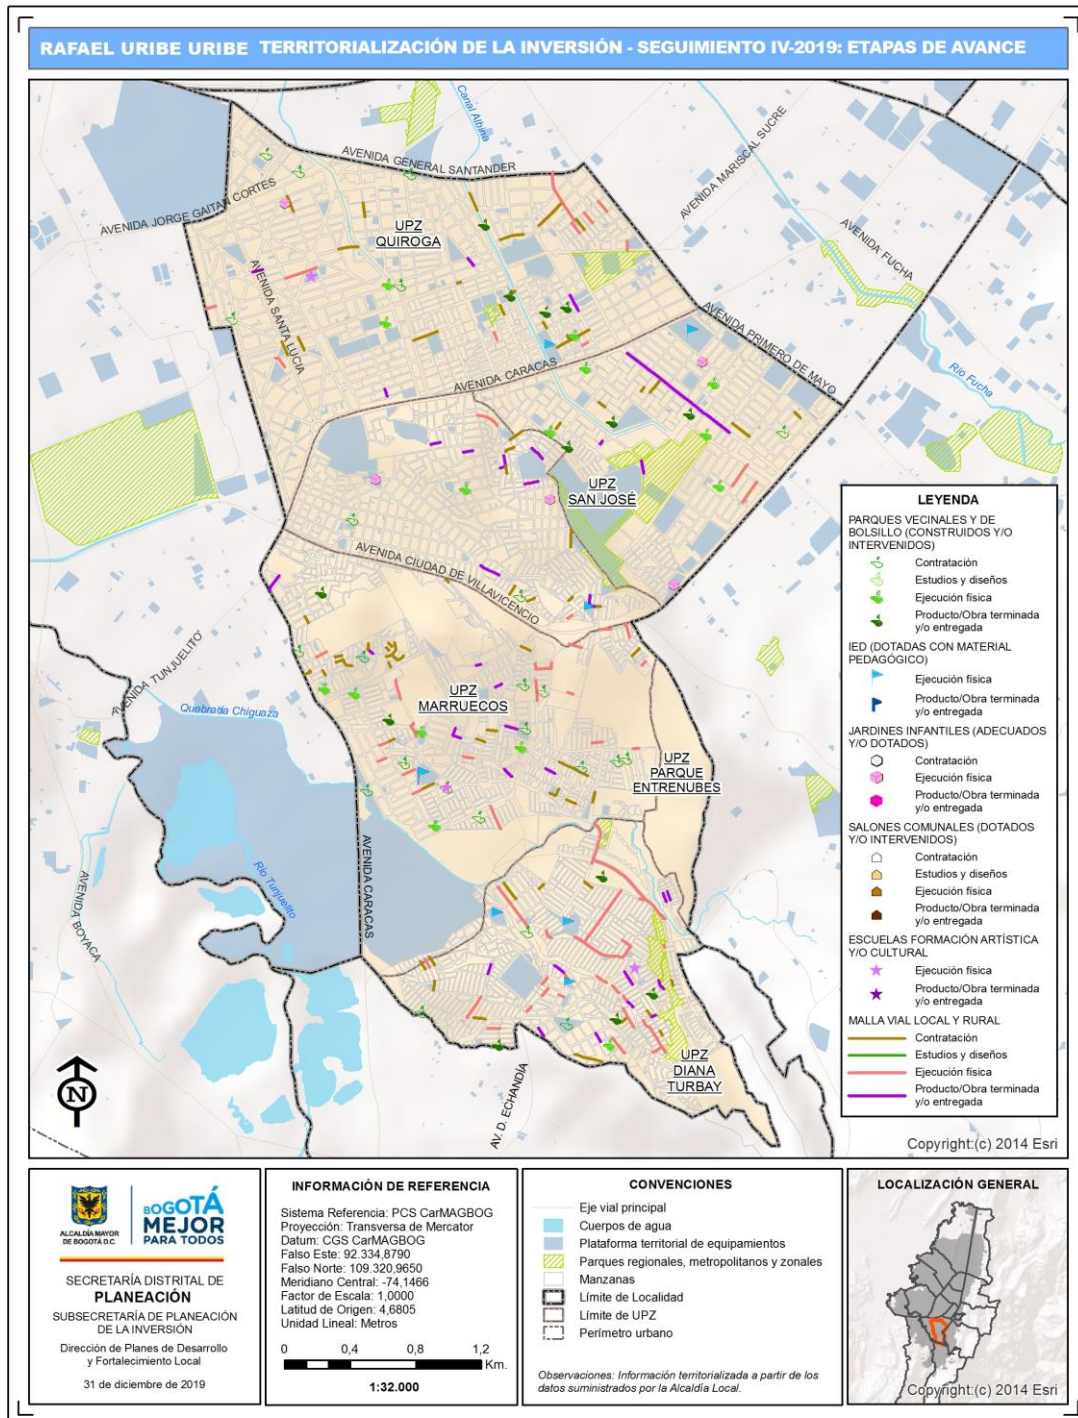

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Fuente: Visor territorialización MUSI

Tabla No. 11. Territorialización malla vial local.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18000544	CL 31B BIS SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18000572	KR 27	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18000779	CL 28 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18000851	CL 28 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001240	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001282	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001340	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001376	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001415	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001458	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001521	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001578	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001600	CL 40 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001633	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001682	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001759	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001876	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18001924	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002028	KR 12H	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002032	KR 13F BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002096	KR 13D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002153	CL 32ABISB SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002203	DG 32G SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002216	KR 13 A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002229	CL 32ABISB SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002342	KR 12 J	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002359	KR 12 J	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18002366	KR 12 J	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18003057	CL 43 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18003086	CL 43 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18003124	CL 43 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18003427	KR 10B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18003438	CL 39 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18003820	DG 49D SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18003958	KR 10	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18004145	KR 9	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18004515	CL 48J SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18004560	TV 5W	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18004581	DG 48B BIS ASUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18004882	CL 48 P SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18004884	CL 48L S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18004903	CL 48 P SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005366	CL 48P SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005373	CL 48PBIS SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005391	CL 48P SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005405	CL 48PBIS SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005837	CL 49 C SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005890	CL 49 C SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005916	KR 4C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005922	CL 49A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18005967	CL 49A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006005	CL 48X S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006032	CL 48X S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2018	18000106	CL 26 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006221	CL 49B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006295	KR 2D E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006446	CL 53 BIS A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006500	CL 50 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006890	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006891	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006896	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006897	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006898	CL 27SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006902	CL 28 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18006903	CL 28 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18007329	CL 49A SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18007451	TV 13D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18007452	TV 13D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	18007630	KR 13F BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	30000236	CL 43 SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	30000840	CL 31A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	30001358	CL 49B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	50005670	CL 49 C SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	50005671	CL 49 C SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	50005706	DG 48L SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2017	50005707	DG 48L SUR	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2018	18004621	DG 40I SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2018	18004626	DG 40I SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2018	18005413	CL 49A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de mallla vial local/rura	2018	18005478	CL 49A SUR	Local	Ejecución física



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005518 CL 49A SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000106 CL 26 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005938 CL 49C SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006038 CL 49B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006059 KR 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006081 CL 49B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006121 CL 50 BIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006153 CL 49B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000159 CL 26 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006253 KR 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006546 CL 49CBISD SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006574 KR 3F E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006582 CL 49CBISD SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007534 KR 3C		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007535 KR 3C		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50005667 KR 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000159 CL 26 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000118 CL 26 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18003547 KR 13		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000210 CL 23 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000212 CL 26 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000277 CL 26 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000283 CL 24A SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000357 CL 26BIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000464 CL 23 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000566 KR 26A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000605 KR 26A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18000826 KR 26		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18001089 CL 31D SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18001135 KR 19		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18001783 KR 13I		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18001866 CL 32 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18002233 KR 10C		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18002382 KR 10C		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18002514 KR 10A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003547 KR 10 B		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18003865 KR 13		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004020 TV 5J		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18003865 CRA 12B		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004157 TV 5L		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004228 CL 48B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004251 TV 5L		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004285 TV 5L		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004567 CL 49BIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005396 CL 48R SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004021 DG 46 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005570 CL 49BIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004021 DG 46 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005600 CL 49BIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004489 CL 49 B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004489 KR 9		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005658 CL 48X SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005681 CL 48X SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005449 KR 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005504 KR 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005571 KR 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005571 CRA 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005617 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005645 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005645 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005691 CL 48R SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007386 CL 48R SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007447 CL 44A SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18003632 KR 9F		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18003665 DG 39D SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18003829 CRA 12B		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18003946 KR 8		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004014 KR 10A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005752 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004166 CL 49 B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004215 CL 49 B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004265 CL 49 B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004619 KR 7		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004644 KR 7		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004781 KR 6A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18004904 KR 5Y		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005001 KR 5U		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005175 CL 48X SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005214 KR 5		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005220 KR 5		Local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005246 KR 5		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005254 KR 5		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005395 CL 48Q SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005419 CL 48Q SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005833 CL 52B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005833 CL 53 Bis SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005965 CL 49B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005982 CL 49B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005674 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005687 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005711 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005735 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005750 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005991 CL 49B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005754 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005755 KR 1F		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18005756 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	18006189 CL 49B S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006189 CL 49B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006320 KR 4C		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006353 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006384 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006397 DG 54 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006403 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006431 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006468 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006502 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006559 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006579 CLL 49ABISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006847 CL 48Q SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006862 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006975 CL 48Q SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006986 DG 48J SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18006864 CL 49 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007227 KR 5		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007227 KR 5		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007232 KR 3		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007352 CL 49BBISA SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007545 CL 48Q SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007763 CL 44A SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007814 DG 48Q SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50001089 KR 5G		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007344 CL 49BBIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000165 CLL 41 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000201 CL 31 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000205 CL 41 s		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000241 CL 35C sur		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000250 KR 26		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000291 KR 26		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000320 CL 25A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000380 KR 25		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000389 KR 25		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000406 KR 25		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000447 KR 27		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000460 KR 27		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000726 KR 23 A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000864 CL 31 B		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18000985 CL 30 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001031 KR 19 B BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001036 KR 23		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001055 KR 23		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001058 KR 19 B BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001084 KR 23		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001099 KR 19 B BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001100 CL 28 c sur		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001122 KR 19 B BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001153 KR 19 B BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001180 CL 42A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001223 AC 44 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001523 KR 12 H BIS A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001567 KR 14 BIS B		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001579 KR 12 H BIS A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001692 CL 30 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001795 CL 23 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001890 KR 13bis		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001949 TV 15 B		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001964 CL 26 B sur		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18001995 TV 15 B		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18002090 KR 13 A BIS A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18002249 DG 32G SUR		Local	Contratación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18002837 DG 32 B SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003265 CL 48 C		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003337 KR 11 H BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003398 KR 11 D		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003402 KR 11 A BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003446 TV 11		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003594 CL 50B SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003755 CL 49A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003792 DG 44A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003833 KR 11 B		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003843 KR 4C		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003863 KR 12A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003871 KR 11 B		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003895 KR 11A BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003896 CL 49A BIS A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003918 KR 12		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003945 CL 49A BIS A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003953 KR 11 D		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18003954 CL 49 H SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004004 CL 49B SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007345 CL 49BBIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004057 KR 12 A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004059 CL 50 B SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004104 CL 50 B SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004534 DG 48 J BIS S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004599 KR 7		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004609 DG 48 K BIS S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004836 CL 48 K s		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004897 CL 48 K s		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18004979 KR 5U		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005006 KR 5D		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005054 KR 5 A		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005065 CL 48N SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005321 CL 48RBIS S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005326 KR 5 C		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005387 CL 49BIS S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005815 CL 53B SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	18007346 CL 49BBIS SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18005858 CL 53C SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18006010 CL 48R S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18006046 CL 53 Bis SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18006296 CLL 49A S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18006312 DG 53 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18006329 DG 53 SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18006434 CL 49A S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18006919 KR 24		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007347 KR 2B E		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007348 KR 2B E		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007465 DG 49C BIS A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007471 CL 49A BIS SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007472 CL 49A BIS A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007473 KR 11A BIS		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007562 CL 48N SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007711 CL 48 K s		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	18007789 CL 48 K s		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30001318 KR 12 K		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50000378 DG 50 BIS S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50000379 DG51A BIS S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50001073 CL 49A SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50001074 KR 11 C		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50004997 DG51A BIS S		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50008023 CL 50B SUR		Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1544-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50009406 TV 3		Local	Contratación

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Tabla No. 12. Territorialización parques.

Código proyecto	Vigencia	Nombre parque	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll. 28 Sur entre Cr 15A y Tv. 15A	Bolsillo	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Av Cr 24 con Cll. 37 Sur Costado Suroccidental	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll. 28A y 30 Sur entre CR 10C y 11	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Entre Cr 5J y Cll. 48JBis Sur	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll. 48 Q con Dg 49 Sur	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cr 14 B con Dg 36 Sur	Bolsillo	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll 50 C Sur con Cr 11A	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cr 15 Bis A con Cll. 32 Sur Costado R Oriental	Bolsillo	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll. 49D Bis Sur (Dg. 48Bis G Sur) con Cr 5L Bis	Bolsillo	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Entre Cr 18A y Cr 18Bis con el costado Sur Occidental de la Cll	Bolsillo	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cr 11A Entre Cll 50A y 50 Sur	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll. 49A Sur y 49C con Cr 5 Bis	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cr 24B con Dg. 36 Sur	Bolsillo	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll. 26 Sur y Av. 1 de Mayo con Cr 12 D	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2017	<Null>	Cll. 27 A Sur con Cr 12 Bis y 12 C	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	DIAG 48 F Sur con TRANS 5 L Bis	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 43 A S con TRANSVERSAL 12B	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	TRANS 34C con Dg. 40 A Sur	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	TRANS 5 con Cll. 48 Bis SurE	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cr 12 H Bis B con Cll. 30 S	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Dg. 39 B Sur con Cr 33	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 50 D Sur con Cr 13A	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cr 5L con Cll. 49 Sur	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Dg. 48 y Sur con Cll. 49 C Sur	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 49 F Bis Sur Entre CrS 10 y 9	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 52 Sur con Cr 1B E	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cr 5 con Cll. 48 R S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	AV 27 con Cll. 35 S	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	AC 51 S con Cr 5Z	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 49 G S Entre Dg. 49 D S y Cr 13 Bis A	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 48 J S con Cr 5D	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll.EL 49 C Sur con Cr 2 C S	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 25 S con Cr 10 A	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 28 A Bis Sur con CARERA 21	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 30 Sur con Cr 21 y Cr 21 B	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Dg. 45 D S con Tv. 16 F	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Dg. 49 F Bis S	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Dg. 55 Bis S con Cr 4 M	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 49 Bis A Sur Entre CrS 1 D E y 2C E	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	AV 24 con Cll. 37 S	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cr 12 D Entre Cll.S 27 Sur y 2 C S	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Dg. 48 A Bis S con Tv. 5I	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	DIAGONA 48 J S con TRANSVERSAL 1	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 28 S con Cr 26A	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Dg. 54 C S con Cr 3D	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cr 21 B con Cll. 29 Sur	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 49 C Bis S con Cr 5 Bis	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Tv. 11 A con Dg. 49 D S	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 32 Bis S Entre Cr 13 y 12K	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cr 25 con Cll. 46 S	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1543-00	2018	<Null>	Cll. 31 S con Cr 23 C	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI

Tabla No. 13. Territorialización Jardines Infantiles.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Jardín Infantil	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1535-00	2017	14012138 <Null>		Cll. 24 Sur 12 G 9	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1535-00	2017	14113879 <Null>		Dg 45 Bis B Sur 13 F 36	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1535-00	2017	14135313 <Null>		CR 10 39 15 Sur	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1535-00	2017	14250901 <Null>		CR 12 G 32 B 03 Sur	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1535-00	2017	14263901 <Null>		CR 10B 35 2 Sur	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1535-00	2017	23073002 <Null>		Cll. 41 Bis Sur 31	VECINAL	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Tabla No. 14. Territorialización Instituciones Educativas Distritales.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre IED	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1539-00	2017	14011001 <Null>		AV CARACAS 23 24 Sur	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1539-00	2017	14315401 <Null>		Tv. 11A 38 G 16 Sur	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1539-00	2017	25353901 <Null>		CR 2B 49D 41 S	<Null>	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1539-00	2017	25116601 <Null>		Cli. 49C Sur 5C 09	<Null>	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1539-00	2017	22094101 <Null>		CALL 30 Sur 15 45	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1539-00	2017	14219210 <Null>		Cli. 48Z Sur 43 6	VECINAL	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1539-00	2017	14149101 <Null>		Cli. 49D Bis Sur 5X 02	VECINAL	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI

Tabla No. 15. Territorialización Escuelas de Formación Artística.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Lugar	Dirección	Etapas avance
3-3-1-15-01-11-1540-00	2018	0 <Null>		Calle 43 Sur N. 16 B-1	Ejecución física
3-3-1-15-01-11-1540-00	2018	23074001 <Null>		Carrera 26ª N. 41-10 Sur	Ejecución física
3-3-1-15-01-11-1540-00	2018	0 <Null>		Carrera 14 Bis N. 31C-33 Sur	Ejecución física
3-3-1-15-01-11-1540-00	2018	0 <Null>		Calle 41G Sur N. 5x-15	Ejecución física
3-3-1-15-01-11-1540-00	2018	14223029 <Null>		Carrera 1 N. 49-36 Sur	Ejecución física
3-3-1-15-01-11-1540-00	2018	0 <Null>		Calle 41ª Sur N. 31-46	Ejecución física
3-3-1-15-01-11-1540-00	2018	14188401 <Null>		Calle 49C N. 5T-18 Sur	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

PILAR 1. IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA.

Lo constituyen los proyectos asociados a las metas siguientes para cada una de las cuales separadamente acotamos la información de importancia:

META 1535-1 Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, incluyendo los HOBIS del ICBF.

Se presenta un avance normal de la meta. Sin embargo, la dificultad en el cumplimiento de la misma estriba en el hecho de la obligación de dar cobertura de beneficio al ICBF bajo el entendido que se trata de una institución del orden nacional, situación que conlleva dificultades en el proceso administrativo de ingreso de los elementos a almacén, no obstante se cumple con la aplicación de la política pública de infancia y adolescencia al no discriminar a los niños de la Localidad sino por el contrario entregar beneficio para ellos. La línea de la Secretaría de Integración Social es clara frente a la dotación de jardines infantiles; sin embargo, la redacción de la meta dificulta la dotación a las unidades de ICBF existentes en la localidad, por lo tanto es importante identificar para el 2020 si se da alguna modificación a la línea, con el fin de beneficiar a los niños y niñas de la comunidad local sin discriminar la entidad que los cobija con la atención a la primera infancia

META 1536-1 Beneficiar 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C.

En este proyecto beneficia anualmente a 6500 habitantes de la localidad, es una meta constante en el Plan de Desarrollo y los ingresos que se están realizando a la fecha están regidos por los criterios de la resolución 764 del 2013. De igual modo, el proceso de REFOCALIZACIÓN donde se verifica las condiciones de Vulnerabilidad para dar permanencia o egresos del Apoyo Económico Tipo C, están en coherencia con los criterios de la resolución 825 de junio 2018.

El cumplimiento de este meta se registra normal de acuerdo con lo programado. A la fecha de corte se reporta un avance contratado / avance ejecutado del (75% / 75%), de manera que no se reporta atraso en la ejecución.

Las fortalezas que muestra el ejercicio es que se genera un vínculo con la persona mayor para que puedan incluso expresar los problemas familiares, incluso manifestando amenazas y maltrato por parte de familiares cercanos.

Como debilidades se manifiesta la interrupción de visitas domiciliarias por otros procesos, pues es condición para la ejecución de otros programas de beneficio al adulto mayor, el que no sean beneficiarios de otros programas locales; Y que los ingresos son enviados directamente por la SLIS lo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



cual se solicita mensualmente, en este sentido los ingresos que enviaron en la vigencia del 2018 a partir de junio fueron nulos en algunos meses insuficientes, afectando significativamente la vigencia del 2019 para mantener la cobertura de los beneficiarios.

META 1537-1 Beneficiar 1000 personas de la localidad con ayudas técnicas - que no se encuentren incluidas en el POS.

A la fecha de corte se reporta un avance contratado / avance ejecutado normal, de manera que no se reporta atraso en la ejecución. Aún así, resulta importante mencionar que durante la ejecución del proyecto se encuentra que el número de solicitudes que en materia de ayudas técnicas se recepcionan por parte de ciudadanos en condición de discapacidad residentes en la localidad, supera la capacidad del proyecto, siendo por tanto necesario como línea de acción estimar mejor el valor a apropiar.

META 1538-1 Realizar 4 obras de mitigación de riesgo anualmente.

Se trata de una meta que no muestra progreso significativo, debido a la dificultad que representa para la localidad la fase de los estudios y diseños, cuyos resultados al final del proceso no se logran implementar puesto que se hace necesario clarificar la fase de la competencia de las obras en terrenos cuya titularidad no es clara.

La potencialidad del riesgo se acrecenta por la localización de numerosos asentamientos urbanos en zonas de riesgo con amenaza de media a alta por remoción en masa, que conlleva a la necesidad de adelantar acciones intersectoriales pues la solución de las problemáticas que esto origina así lo exige.

Durante la vigencia 2019 no fue posible realizar el proceso de contratación de los recursos destinados para tal fin, toda vez que la falta de los diseños contratados en vigencias anteriores no fueron suministrados en su totalidad para la ejecución de las obras.

META 1539-1 Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico.

La ejecución financiera y física de la meta avanza linealmente según la programación plurianual. Los insumos para la dotación a colegios responden a los criterios técnicos que determina la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. En lo que corresponde a la vigencia 2019 la entidad determinó que se debía dotar a los colegios beneficiarios con material tecnológico, quedando como aspecto a superar el de la necesidad de otros elementos de dotación de los cuales adolecen las instituciones.

Como logro del proceso se tiene que el hecho de firmar un convenio conjunto con otros (16) fondos de Desarrollo Locales y la Secretaría de Educación, como sector encargado de los IED en la Localidad, permitió generar un proceso mucho más eficiente en términos de presupuesto y entregas por economías de escala.

META 1540-1 Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y cultural, incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Con recursos vigencia 2019 se logró contratar al escuela de formación artística y cultural y a su vez se ejecutó la escuela de la vigencia 2018. Como logro se puede identificar el beneficio constante a la comunidad con programas que exaltan el talento local, por lo que resulta de suma importancia realizar diferentes eventos que consoliden el potencial de las agrupaciones a nivel local.

META 1540-2 Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU.

META 1540-3 Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad.

META 1540-4 Realizar 8 eventos de recreación y deporte en la localidad.

Los proyectos participativos que vinculan a la población local en programas culturales y recreodeportivos no cubren la demanda. Es importante considerar que este tipo de iniciativas coadyuvan indirectamente a la mejora de la seguridad y de la salud. Se hace entonces necesario diagnosticar con mejores herramientas técnicas a la población potencialmente beneficiaria.

PILAR 2. DEMOCRACIA URBANA.

META 1541-1 Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la correspondiente demanda de titulación del predio.

META 1543-1 Intervenir 60 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad.

META 1544-1 Construir 8 Km/carril de malla vial local.

META 1544-2 Mantener 24 Km/carril de malla vial local, incluyendo bacheo y reparcheo.

META 1544-3 Construir 15000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas.

META 1544-4 Mantener 20000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas.

Como logro se destaca que las inversiones, que en su mayoría conciernen a procesos de obra pública, son adjudicadas en procesos transparentes, atendiendo las disposiciones que en materia de utilización de pliegos tipo exige la Ley. Resultado de ello, es que las firmas adjudicatarias cuentan con la idoneidad y capacidades financieras esperadas, situación que como resultado otorga obras de calidad, situación que se demuestra con la no aplicación de las cláusulas excepcionales en alguno de los procesos de obra que conforman el conjunto.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Las dificultades en este pilar se remiten principalmente a la ejecución de la meta 1541-1 - *Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la correspondiente demanda de titulación del predio*, en donde aun cuando el objetivo previsto se cumple, este no cubre la totalidad de las etapas que conforman un proceso jurídico, pues con el proyecto solo se recauda la información jurídica y se presentan las demandas ante diferentes despachos judiciales de la ciudad, en tanto que las etapas siguientes de seguimiento, vigilancia y sustanciación, quedan sujetos a procesos diferentes.

Por lo anterior, se considera necesario destinar recursos del presente Plan de desarrollo Local para la contratación de abogados que se dediquen a realizar el seguimiento y actuaciones en cada uno de las demandas y así concluir el proceso.

PILAR 3. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD.

META 1545-1 Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para seguridad en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y dotación a la policía de la localidad.

META 1545-2 Vincular 4000 personas de la Localidad a ejercicios de convivencia ciudadana.

El desarrollo de la ejecución de los diferentes procesos contra actuales se pudo evidenciar que la problemática de seguridad en la localidad es muy alta por lo tanto todos los esfuerzos económicos, sociales y administrativos son pocos.

Como logros a destacar se informa que los vehículos adquiridos en esta vigencia son de alta calidad y entran a fortalecer la deficiencia de los que se encontraban en los (39) cuadrantes y (8) CAI's de la localidad. Se consigue impactar a más de (7500) habitantes de la localidad en temas de formación, sensibilización sobre la implementación del código de policía, sistemas de monitoreo y convivencia, así como el trabajo y articulación de comités de seguridad, mujeres vulneradas, barristas y población escolar.

La dificultad más grande que se presenta es la falta de credibilidad en las instituciones como la Policía, debido al bajo pie de fuerza que tiene en el territorio.

Adicionalmente, la línea técnica de seguridad que debe emitir el SECTOR, para la dotación de vehículos solo fue proporcionada a la Alcaldía Local en el mes de diciembre del año pasado, esto dificulta y retrasa los procesos de contratación y aunque el proceso contractual se hace mediante la tienda virtual de Colombia compra eficiente, siendo un proceso mucho más ágil, la demora en el lineamiento de la Secretaría de Seguridad, no permitió que se pudiera ejecutar el recurso en la misma vigencia 2019.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



EJE TRANSVERSAL. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA.

META 1546-1 Intervenir 1000 árboles de la localidad.

META 1546-2 Intervenir 5000 m2 de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo.

META 1547-1 Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad.

META 1548-1 Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de esterilización.

Las acciones desarrolladas para la ejecución de meta en este pilar se ejecutan con apoyo de las entidades distritales en estos temas. Los logros que mencionar atañen a que la recuperación ambiental de la localidad está por los menos cubierta con este tipo de proyectos, que cuentan con la participación de la comunidad mediante la apropiación de espacios y el cuidado de los sectores intervenidos. En este sentido se destaca la implementación de nuevos sectores de jardinería urbana de que trata el Decreto 531 de 2010 como elemento integral del paisaje y el mantenimiento de los ya existentes.

No obstante, el deterioro ambiental en la localidad es enorme representado en el manejo inadecuado de los escombros y residuos como resultado de comportamientos inapropiados de la población.

De otra parte, la comunicación con el Jardín Botánico no fue la más apropiada, por lo tanto, la totalidad de las actividades del convenio de arborización (siembra y mantenimiento) ejecutado en la vigencia 2019, no han sido reportadas a la Alcaldía Local siendo necesario requerir a dicha entidad para que se genere la sinergia interinstitucional que permita cumplir la meta del plan de desarrollo.

Se debe mencionar igualmente que no está asegurado la participación de la comunidad en el mantenimiento de los muros verdes y paisajismo implementados y como tal la sostenibilidad del programa está sin cubrir, pues estas actividades están a cargo de la comunidad.

Frente al programa de asistencia para el control de mascotas, se menciona la dificultad para convocar a las comunidades a las actividades de esterilización, situación que exige desde el accionar local el desplegar acciones de sensibilización con mayor cobertura en la población. Igualmente se cita que el alcance de la meta no mide en términos de resultados operativos sino de procesos adelantados, circunstancia que no permite visualizar el real impacto de las operaciones adelantadas, pues el resultado que se muestra evidencia únicamente el compromiso de los recursos, pero no el resultado logrado al final del proceso con los mismos.

EJE TRANSVERSAL. GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



META 1549-1 Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, incluidas razas de perro peligrosas.

META 1549-2 Cubrir 11 ediles con el pago de honorarios.

META 1549-3 Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional.

META 1550-1 Fortalecer 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con asiento en la localidad, e intervención y dotación a salones comunales.

META 1550-2 Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, incluyendo copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad.

Este Pilar atiende principalmente el aspecto más importante para la Administración como es la participación activa de la ciudadanía en el Gobierno local. Entre los logros a destacar tenemos el cumplimiento de la meta, circunstancia que da cuenta del grado de compromiso local en el tema. Se destaca que han sido incluidas en la ejecución, diferentes instancias participativas. Se puede mencionar que fueron adelantados eventos comunitarios de importancia, como lo es la semana de la juventud y la realización de tres eventos festivos de expresiones artísticas, el fortalecimiento de la mesa de medios de comunicación comunitario, el festival de la diversidad y el primer encuentro local de la mesa de víctimas.

Como dificultades se tienen que no se logran resultados efectivos con respecto a : La baja apropiación de los espacios participativos por parte de la comunidad siendo necesario adecuar el enfoque de los proyectos para reforzar este importante aspecto; El desconocimiento de la comunidad de su papel frente al accionar de las instituciones estatales y el poco interés que demuestran en participar en las instancias tanto institucionales como sociales que deriven en el efectivo control social que establece la Constitución Política, en defensa de derechos e implementación de políticas públicas poblacionales con enfoque diferencial (etnias, mujer y géneros, juventud, víctimas. LGBTI y niñez); Igualmente la dotación y adecuación de escenarios como los salones comunales es un aspecto pendiente, teniendo en cuenta las condiciones de la estructura física, muebles y equipos que se requieren para su buen funcionamiento, para garantizar a la comunidad un mejor uso de los inmuebles requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades y eventos programados por ellos mismos.

Se cita como punto importante que a pesar de que se establece a través del Acuerdo 13 de 2000, que los ciudadanos participen en la priorización de programas a ejecutarse en las localidades, finalmente las decisiones concertadas y aprobadas en los Encuentros Ciudadanos generalmente no son tenidas en cuenta por los actores institucionales en la forma en que fueron aprobadas por la ciudadanía.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Los diferentes ejercicios de participación no solo en la localidad sino a nivel distrital, han tenido grandes dificultades para cumplir las expectativas de la ciudadanía, en la medida en que lo que se discute y decide en estos espacios, se materializa por parte de las autoridades de planeación, tanto locales como Distritales.

Por ultimo, es clara la debilidad de la ciudadanía en la discusión técnica y propositiva que responda a indicadores reales de los territorios del distrito y que promuevan un determinado enfoque de desarrollo, ya que se evidencia el interés por posicionar “proyectos” particulares que poco le aportan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad y en cambio aumentan los niveles de insolidaridad. Las diversas instancias de participación local no cuentan con herramientas adecuadas para su convocatoria, su movilización y funcionamiento en general, lo que dificulta sus reuniones, dispersión en la toma de decisiones y descoordinación en sus acciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019

Ver Anexo No 1.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
